




TIEFE	BODENART
0.45	Auffüllung (Schotter, schwach sandig), grau
0.70	Auffüllung (Schotter, 25 % Feinanteil, leicht verschmutzt, reinigungsfähig, schwach sandig), grau
1.40	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig, schwach feinkieslig, schwach schluffig), schwach feucht, [SU], braun

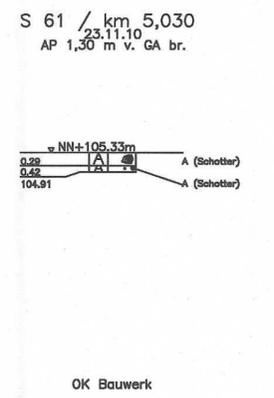


TIEFE	BODENART
0.29	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig, schwach sandig), grau
0.42	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig, sandig), grau

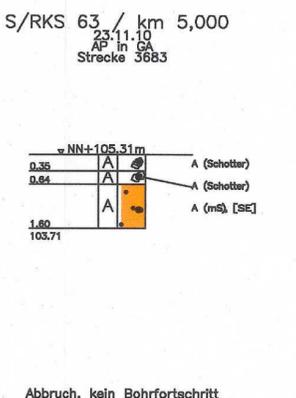


TIEFE	BODENART
0.35	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig, schwach sandig), grau
0.64	Auffüllung (Schotter, 25 % Feinanteil, leicht verschmutzt, reinigungsfähig, sandig), grau
1.60	Auffüllung (Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinkieslig), schwach feucht, [SE], braun

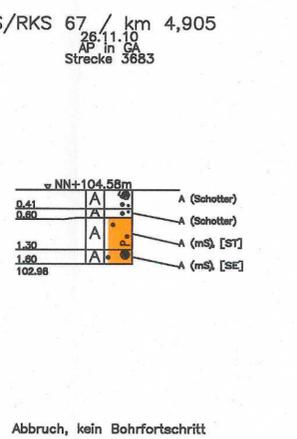

TIEFE	BODENART
0.41	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig, schwach sandig), grau
0.60	Auffüllung (Schotter, 25 % Feinanteil, leicht verschmutzt, reinigungsfähig, sandig), grau
1.30	Auffüllung (Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinkieslig, schwach tonig, variszit Tonlinien), schwach feucht, [ST], grau
1.60	Auffüllung (Mittelsand, schwach fein- bis grobsandig), schwach feucht, [SE], rotbraun

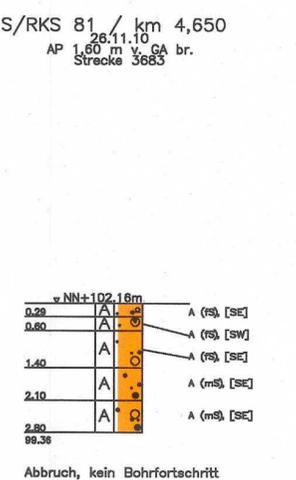

TIEFE	BODENART
0.29	Auffüllung (Feinsand, mittelsandig, schwach feinkieslig, schwach tonig, variszit Tonl), feucht, [SE], hellbraun
0.60	Auffüllung (Feinsand, mittelsandig, schwach mittel- bis grobkieslig), feucht, [SW], graubraun
1.40	Auffüllung (Feinsand, mittelsandig, schwach mittelkieslig), feucht, [SE], rotbraun
2.10	Auffüllung (Mittelsand, schwach fein- bis grobsandig), schwach feucht, [SE], rotbraun
2.80	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig- schwach feinsandig, schwach mittelkieslig, schwach feucht, [SE], rotbraun

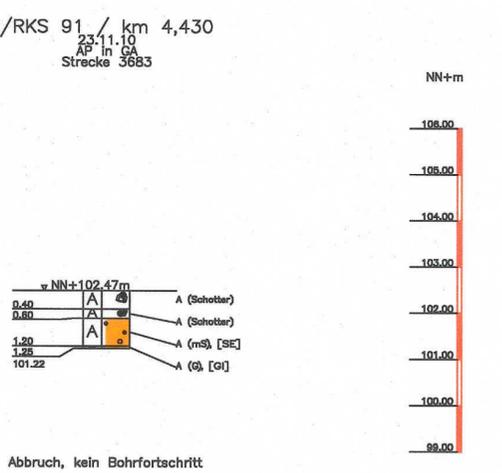

TIEFE	BODENART
0.40	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig, schwach sandig), grau
0.60	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reinigungsfähig, sandig), grau
1.20	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig, schwach feinkieslig), [SE]
1.25	Auffüllung (Kies, stark sandig), schwach feucht, [G], rotbraun

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen Name: Datum:

(Genehmigungsvermerk des EBA)

Nur zur Information

Prüfdaten

### Unterlage nur zur Information

<b>Auftragnehmer:</b> DB NETZE DB Netz AG Regionalbereich Mitte Fachplanung sonstige Gewerke Pfarrer-Perabo-Platz 4 68326 Frankfurt/Main	<b>Planverfasser:</b> DB International GmbH Baugrund Büro Frankfurt am Main Oskar-Sommer-Strasse 15 68596 Frankfurt am Main  Ffm. 30.03.2012, gez. I.A. Ch. Sielisch Ort, Datum, Unterschrift	<b>Laufende Nr.:</b> Auftrag-Nr.: PF 30 368 01
		gez. 01/2011 Hofmann bearb. 01/2011 Falkner gepr. 01/2011 Sielisch
<b>Bauherr:</b> DB NETZE DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Mitte Leber-Platz 49 68528 Frankfurt/Main  Ffm. 30.03.2012, gez. I.V. R. Ditzgen Ort, Datum, Unterschrift	<b>Planung:</b> DB NETZE DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Mitte Leber-Platz 49 68528 Frankfurt/Main  Ffm. 30.03.2012, gez. I.V. R. Ditzgen Ort, Datum, Unterschrift	<b>Plan-Nr.:</b> 3.1
		<b>Planart:</b> Genehmigungsplanung <b>Ursprung:</b> Blattgr.: 297x970
<b>Maßstab:</b> 1:100 l. W.		<b>Einwirkungen (Lastmodelle):</b> Hohen- und Koordinatensystem
<b>Projekt:</b> Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe <b>Strecke:</b> Ffm Abzweig Gutleuthof - Mannheim - Pfingstberg (Str. 3657)		
<b>Bauwerksnummer</b>		<b>Brückennr.</b>
<b>Strecke</b>	<b>Bestands-Kilometer</b>	<b>Kennzahl</b>
x		x
<b>Barcode</b>		Barcode
